ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly (OPŽP - vodovod)**	**782 days**	**Mon 3.1.11**	**Tue 31.12.13**	
2	výběrové řízení na stavebního zhotovitele	173 days	Mon 3.1.11	Wed 31.8.11	
3	rozhodnutí o přidělení dotace	1 day	Thu 24.11.11	Thu 24.11.11	2FS+60 days
4	realizace	457 days	Mon 2.4.12	Tue 31.12.13	3FS-90 days
5					
6	**Vodohospodářské investice města Úvaly (OPŽP - kanalizace)**	**586 days**	**Fri 1.4.11**	**Fri 28.6.13**	
7	rozhodnutí o přidělení dotace	1 day	Mon 1.8.11	Mon 1.8.11	
8	realizace	586 days	Fri 1.4.11	Fri 28.6.13	7FS-90 days
9					
10	**Vodovodní přivaděcí řad Jirny - PČS Fibichova (Úvaly)**	**804 days**	**Wed 1.6.11**	**Mon 30.6.14**	
11	zpracování DUR, DSP a jejich projednání	218 days	Wed 1.6.11	Fri 30.3.12	
12	dotační řízení (od zpracování žádosti po schválení dotace)	261 days	Mon 2.1.12	Mon 31.12.12	11FS-68 days
13	výběrové řízení na stavebního zhotovitele	130 days	Mon 2.4.12	Fri 28.9.12	11
14	realizace	326 days	Mon 1.4.13	Mon 30.6.14	12FS-90 days;13F

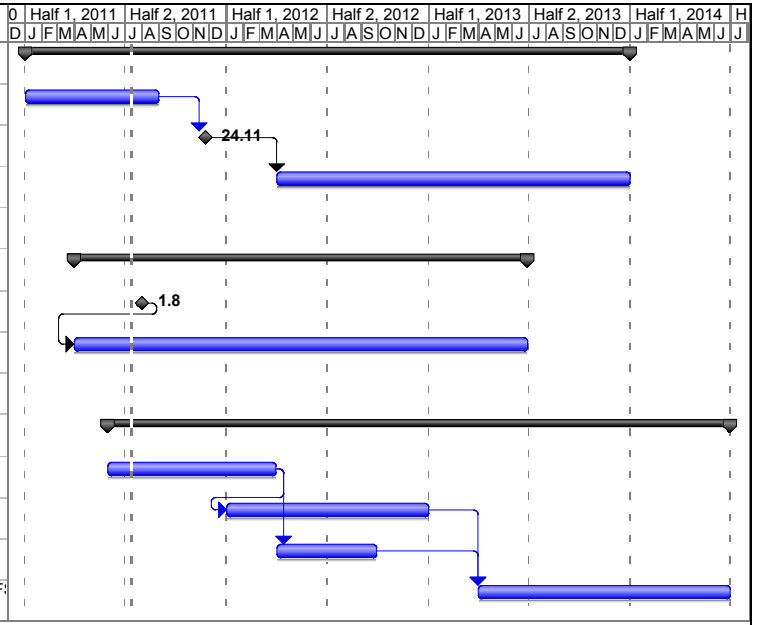

Project: VHI města Úvaly
Date: Tue 12.7.11

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
